TAM LBrev1 ACT OCT20-1

ACT NOV 2020

Activity ID	Activity name (Portugues)	Start	Finish
PROJETO SE TÂMEGA LB rev1 ACT 2020-10-2		08-12-14 A	28-06-24
PROGRAMA RESUMO		08-12-14 A	28-06-24
SUBESTAÇOES E LINHAS		06-01-16 A	12-10-23
RES1050	Subestação 60/20 kV	06-01-16 A	13-04-17 A
RES1040	PC 60 KV EDP	07-01-16 A	28-12-16 A
RES1090	Linhas 20 kV	07-01-16 A	01-06-17 A
RES1080	Linhas 60 kV EDP	07-01-16 A	17-03-17 A
RES1010	PC GOUVAES 400 Kv	02-01-18 A	16-04-21
RES1070	Linhas 400 kV Gouvães	02-04-19 A	30-12-20
RES1130	Linhas 400 kV Daivões	19-06-19 A	30-12-20
RES1140	Linhas 400 kV Alto tâmega	13-01-20 A	28-01-22
RES1030	PC Daivões 400 Kv	01-05-20 A	02-08-21
RES1020	PC Tâmega 400 Kv	01-05-20 A	12-10-23
RES1060	Posições 400 kV em Subestações REN	01-10-20 A	18-01-21
COMUNS		15-07-16 A	02-12-22
RES1000	Pedreira	15-07-16 A	02-12-22
GOUVÃES		08-12-14 A	30-06-22
ACESSOS		08-12-14 A	15-07-16 A
RES1100	Acesso exterior à central de Gouvães	08-12-14 A	22-06-15 A
RES1110	Acessos em Túnel à central de Gouvães	31-08-15 A	15-07-16 A
RES1120	Acesso e plataforma da Subestação	27-11-15 A	01-01-16 A
CENTRAL		13-10-16 A	18-06-21
RES1150	Escavação	13-10-16 A	15-06-18 A
RES1180	Montagem partes embebidas de Grupo	11-07-18 A	25-11-19 A
RES1160	Betonagem	11-08-18 A	31-03-20 A
RES1830	Montagem Grupos	22-07-19 A	18-06-21
RES1170	Arquitetura e acabamentos Central	01-01-20 A	18-12-20
GOUVÃES, TÚNEL DE ADUÇÃO E CHAMINÉ SUPERIOR DE EQUILIBRIO		28-02-17 A	05-03-21
RES1190	Escavação	28-02-17 A	28-02-19 A
RES1200	Betonagem	08-04-19 A	02-02-21
RES1790	Montagem	13-05-19 A	05-03-21
CIRCUITO HIDRÁULICO - FORÇADA		05-10-16 A	22-06-21
RES1210	Escavação	05-10-16 A	15-09-17 A
RES1220	Montagem e betonagens	04-09-17 A	19-10-20 A
RES1230	Tratamentos e enchimento da adução e forçada	01-05-19 A	22-06-21
CIRCUITO HIDRÁULICO - ASPIRAÇÃO, CHAMINÉ INFERIOR DE EQUILIBRIO E TOMADA EM DAIVÕES		13-02-17 A	13-04-21
RES1240	Escavação	13-02-17 A	30-06-18 A
RES1250	Betonagem	01-11-18 A	30-11-20
RES1260	albufeira de Daivões com um nivel mínimo de 220	15-03-21	13-04-21
BARRAGEM		19-12-18 A	31-05-21
RES1270	Escavação Barragem	19-12-18 A	17-07-20 A
RES1280	Betonagem Barragem	28-08-19 A	18-12-20
RES1290	Enchimento da Albufeira (Até a cota 876)	08-02-21	31-05-21
DESMATAÇÃO		01-07-20 A	01-12-20
RES1300	Desmatação GOUVÃES	01-07-20 A	01-12-20
ENTRADA EM SERVIÇO		08-01-21	30-06-22

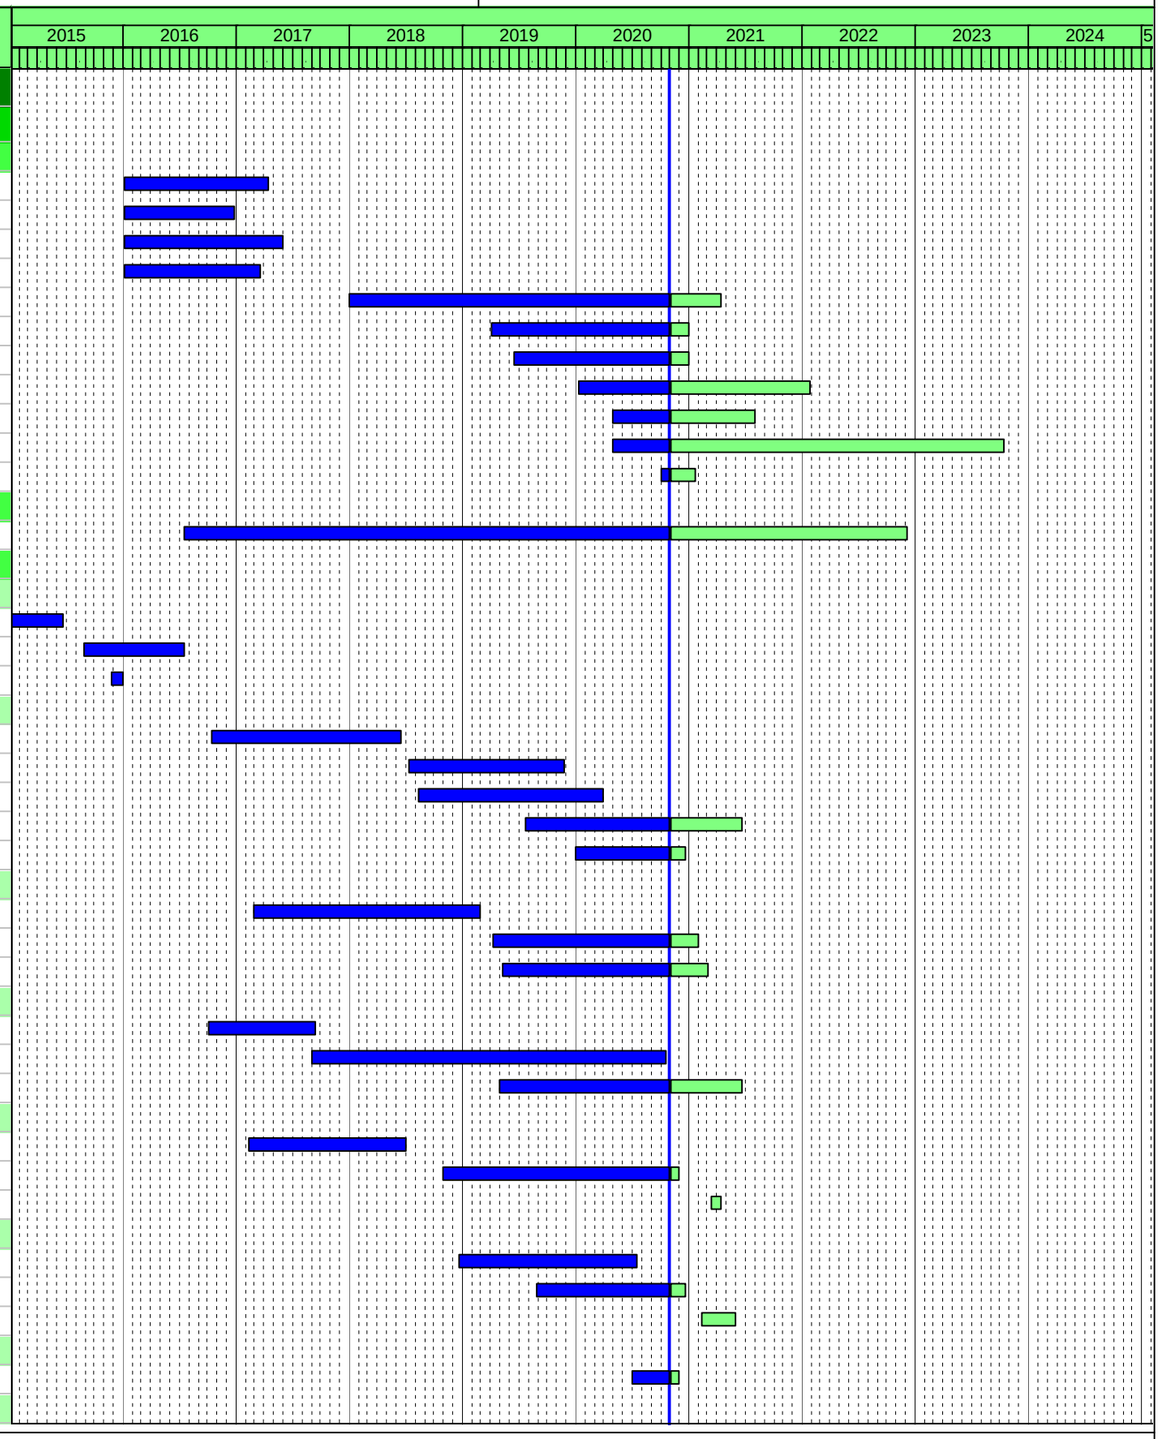

Trabajo Actual
Remaining Work
Critical Remaining Work
Hito

SE ALTO TAMEGA
PROGRAMA RESUMO

TAM LBrev1 ACT OCT20-1

ACT NOV 2020

Activity ID	Activity name (Portugues)	Start	Finish
RES1310	EES Sistemas Comuns	08-01-21	02-04-21
RES1315	Disponibilidade de água para EES Dinâmicas	18-03-21	18-03-21
RES1320	EES Grupo 4	15-10-21*	13-05-22
RES1330	EES Grupo 3	15-12-21*	31-05-22
RES1340	EES Grupo 2	21-02-22*	15-06-22
RES1350	EES Grupo 1	15-04-22*	30-06-22
RES1355	Entrada em Serviçio Gouvães		30-06-22
TÂMEGA		26-02-16 A	28-06-24
ACESSOS		26-02-16 A	06-03-19 A
RES1720	Acessos Margem Esquerda	26-02-16 A	06-03-19 A
RES1730	Acessos Margem Direita	15-05-17 A	08-03-18 A
DESVIO DE RIO		15-12-16 A	17-11-18 A
RES1700	Túnel de Desvio	15-12-16 A	05-10-18 A
RES1710	Ensecadeira auxiliar	01-08-17 A	17-11-18 A
BARRAGEM		03-01-18 A	15-01-24
RES1660	Escavação Barragem	03-01-18 A	27-03-20 A
RES1680	Descarregadores	05-01-18 A	14-10-22
RES1670	Betonagem Barragem	23-10-20 A	03-10-22
RES1690	Enchimento Albufeira	16-10-23	15-01-24
CENTRAL		13-09-18 A	13-07-23
RES1630	Escavação	13-09-18 A	28-05-20 A
RES1640	Betonagem	27-08-20 A	30-05-22
RES1820	Montagem partes embebidas de Grupo	16-11-20	01-11-21
RES1650	Arquitetura e acabamentos Central	30-05-22	16-01-23
RES1840	Montagem Grupos	02-09-22	13-07-23
CIRCUITO HIDRÁULICO		20-11-20	17-03-23
RES1600	Tomada e Poço de ensecadeiras	20-11-20	17-03-23
RES1620	Forçadas	18-12-20	05-02-21
DESMATAÇÃO		03-02-22	30-06-23
RES1610	Desmatação TÂMEGA	03-02-22	30-06-23
ENTRADA EM SERVIÇO		01-03-23	28-06-24
RES1560	EES Sistemas Comúns	01-03-23	10-05-23
RES1580	EES Grupo 1	16-08-23	13-02-24
RES1570	EES Grupo 2	13-02-24*	28-06-24
RES1575	Entrada em Serviçio Tâmega		28-06-24
DAIVÕES		01-09-15 A	07-04-22
ACESSOS		01-09-15 A	05-06-18 A
RES1380	Acessos Margem Esquerda	01-09-15 A	08-03-17 A
RES1390	Acessos Margem Direita	27-05-16 A	05-06-18 A
DESVIO DE RIO		13-06-16 A	22-12-17 A
RES1400	Túnel de Desvio	13-06-16 A	24-10-17 A
RES1410	Ensecadeira auxiliar	03-04-17 A	22-12-17 A
BARRAGEM		09-03-17 A	17-03-21
RES1420	Escavação Barragem	09-03-17 A	26-03-18 A
RES1440	Descarregador (Bacia de dissipação)	15-01-18 A	17-07-20 A
RES1430	Betonagem Barragem	27-03-18 A	20-08-20 A

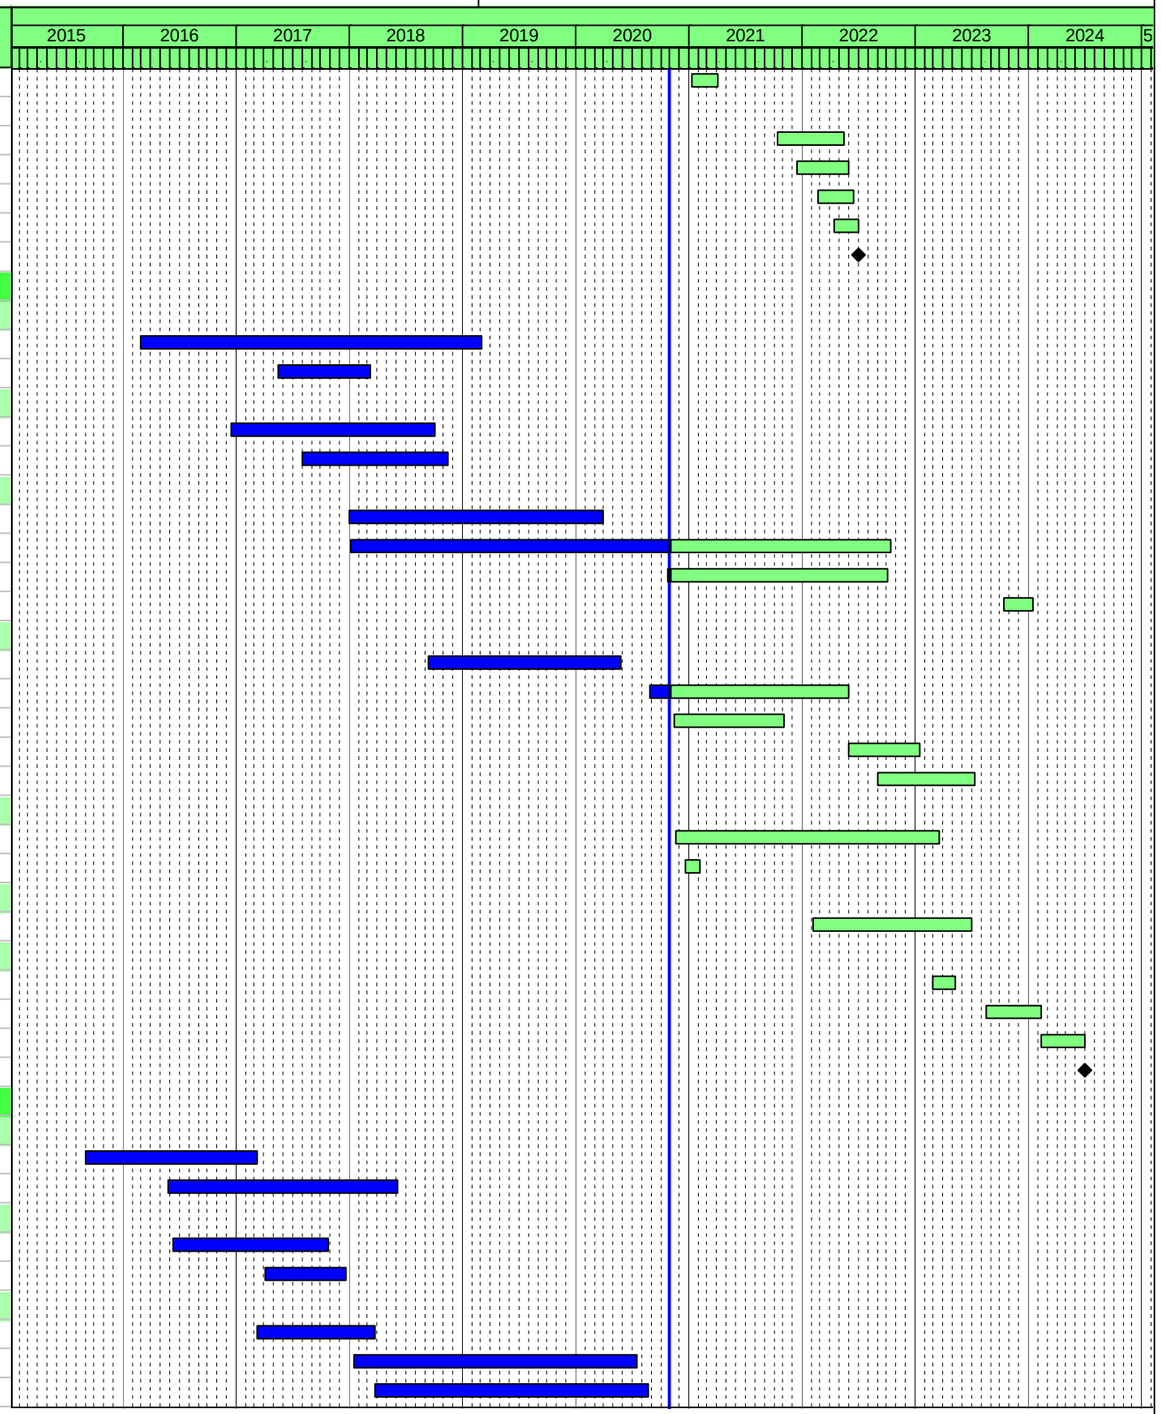

Trabajo Actual
Remaining Work
Critical Remaining Work
Hito

SE ALTO TAMEGA
PROGRAMA RESUMO

TAM LBrev1 ACT OCT20-1

ACT NOV 2020

Activity ID	Activity name (Portugues)	Start	Finish
RES1450	Enchimento Albufeira até cota 220	01-12-20	17-03-21
AÇUDE E REGULARIZAÇÃO DO RIO		25-03-19 A	31-08-21
RES1760	Escavação	25-03-19 A	01-12-20
RES1770	Açude	10-10-19 A	31-08-21
CENTRAL		07-03-17 A	12-11-21
RES1460	Escavação	07-03-17 A	18-05-18 A
RES1470	Betonagem	18-05-18 A	21-09-20 A
RES1800	Montagem partes embebidas de Grupo	07-08-18 A	31-01-20 A
RES1480	Arquitetura e acabamentos Central	24-09-20 A	08-03-21
RES1810	Montagem Grupos	14-12-20	12-11-21
CIRCUITO HIDRÁULICO		26-06-17 A	16-11-20
RES1490	Tomada e Poço de ensecadeiras	26-06-17 A	16-11-20
RES1500	Forçadas	25-09-17 A	01-04-20 A
RES1750	Condução Forçada Caudal ecológico	17-09-18 A	03-08-20 A
DESMATAÇÃO		01-07-19 A	02-11-20
RES1510	Desmatação DAIVÕES	01-07-19 A	02-11-20
ENTRADA EM SERVIÇO		14-06-21	07-04-22
RES1530	EES Sistemas Comuns	14-06-21	13-10-21
RES1540	EES Grupo 2	15-10-21*	21-03-22
RES1740	EES Grupo Caudal Ecológico	22-10-21	16-11-21
RES1550	EES Grupo 1	21-12-21*	07-04-22
RES1850	Entrada em Serviçio Daivões		07-04-22

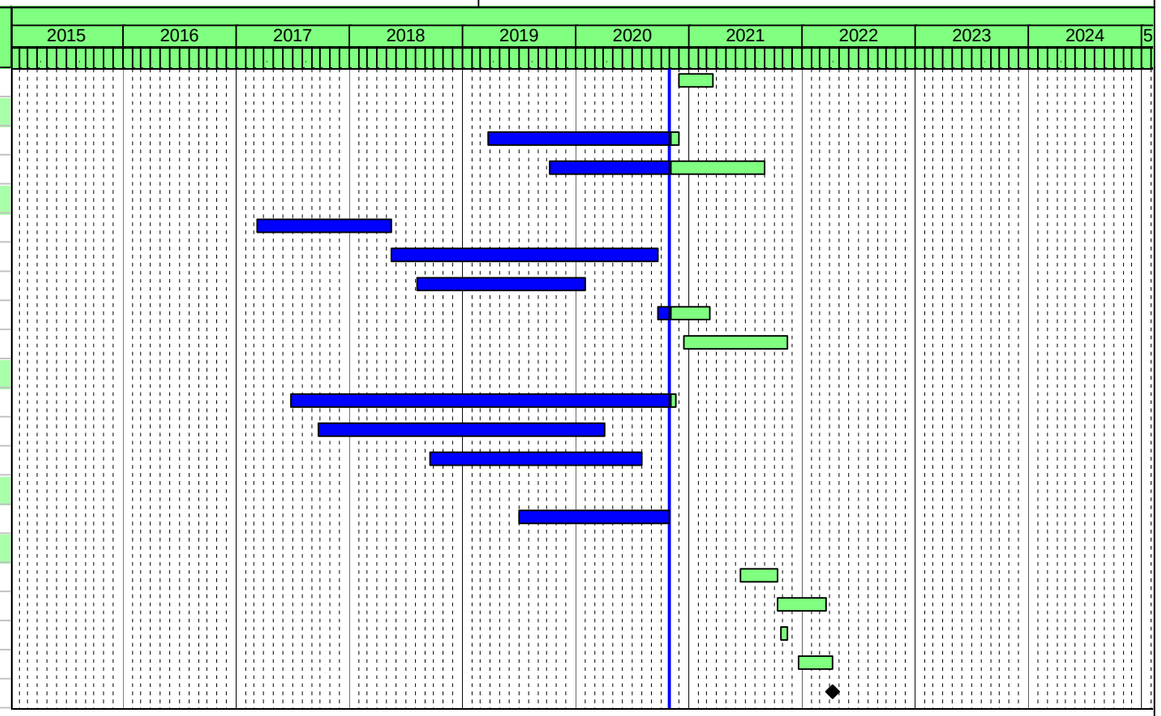

Trabajo Actual
Remaining Work
Critical Remaining Work
Hito

SE ALTO TAMEGA
PROGRAMA RESUMO
