TAM LBrev1 ACT ABR21-2-2-1

ACT ABR 2021

Activity ID	Activity name (Portugues)	Start	Finish
PROJETO SE TÂMEGA LB rev1 ACT 2021-04 APA ABRIL 2021		08-Dec-14 A	28-Jun-24
PROGRAMA RESUMO		08-Dec-14 A	28-Jun-24
SUBESTAÇOES E LINHAS		06-Jan-16 A	12-Oct-23
RES1050	Subestação 60/20 kV	06-Jan-16 A	13-Apr-17 A
RES1040	PC 60 KV EDP	07-Jan-16 A	28-Dec-16 A
RES1080	Linhas 60 kV EDP	07-Jan-16 A	17-Mar-17 A
RES1090	Linhas 20 kV	01-Feb-16 A	01-Jun-17 A
RES1010	PC GOUVAES 400 Kv	02-Jan-18 A	30-Nov-21
RES1070	Linhas 400 kV Gouvaes	02-Apr-19 A	18-Jan-21 A
RES1130	Linhas 400 kV Daivões	19-Jun-19 A	18-Jan-21 A
RES1140	Linhas 400 kV Alto Tâmega	13-Jan-20 A	28-Jan-22
RES1030	PC Daivões 400 Kv	01-May-20 A	30-Sep-21
RES1020	PC Tâmega 400 Kv	01-May-20 A	12-Oct-23
RES1060	Posições 400 kV em Subestações REN	01-Oct-20 A	18-Jan-21 A
COMUNS		15-Jul-16 A	02-Dec-22
RES1000	Pedreira	15-Jul-16 A	02-Dec-22
GOUVÃES		08-Dec-14 A	30-Jun-22
ACESSOS		08-Dec-14 A	15-Jul-16 A
RES1100	Acesso exterior à central de Gouvães	08-Dec-14 A	22-Jun-15 A
RES1110	Acessos em Túnel à central de Gouvães	31-Aug-15 A	15-Jul-16 A
RES1120	Acesso e plataforma da Subestação	27-Nov-15 A	01-Jan-16 A
CENTRAL		13-Oct-16 A	22-Feb-22
RES1150	Escavação	13-Oct-16 A	15-Jun-18 A
RES1180	Montagem partes embebidas de Grupo	11-Jul-18 A	25-Nov-19 A
RES1160	Betonagem	11-Aug-18 A	31-Mar-20 A
RES1830	Montagem Grupos	22-Jul-19 A	22-Feb-22
RES1170	Arquitetura e acabamentos Central	01-Jan-20 A	21-May-21
GOUVÃES, TÚNEL DE ADUÇÃO E CHAMINÉ SUPERIOR DE EQUILIBRIO		28-Feb-17 A	20-May-21
RES1190	Escavação	28-Feb-17 A	28-Feb-19 A
RES1200	Betonagem	08-Apr-19 A	08-Apr-21 A
RES1790	Montagem	13-May-19 A	20-May-21
CIRCUITO HIDRÁULICO - FORÇADA		05-Oct-16 A	03-May-21
RES1210	Escavação	05-Oct-16 A	15-Sep-17 A
RES1220	Montagem e betonagens	04-Sep-17 A	19-Oct-20 A
RES1230	Tratamentos e enchimento da adução e forçada	01-May-19 A	03-May-21
CIRCUITO HIDRÁULICO - ASPIRAÇÃO, CHAMINÉ INFERIOR DE EQUILIBRIO E TOMADA EM DAIVÕES		13-Feb-17 A	12-May-21
RES1240	Escavação	13-Feb-17 A	30-Jun-18 A
RES1250	Betonagem	01-Nov-18 A	15-Jan-21 A
RES1260	Albufeira de Daivoes com um nivel mínimo de 220	19-Feb-21 A	12-May-21
BARRAGEM		19-Dec-18 A	10-Aug-21
RES1270	Escavação Barragem	19-Dec-18 A	17-Jul-20 A
RES1280	Betonagem Barragem	28-Aug-19 A	03-May-21
RES1290	Enchimento da Albufeira (Até a cota 876)	06-Apr-21 A	10-Aug-21
DESMATAÇÃO		01-Jul-20 A	30-Mar-21 A
RES1300	Desmatação GOUVÃES	01-Jul-20 A	30-Mar-21 A
ENTRADA EM SERVIÇO		01-Mar-21 A	30-Jun-22

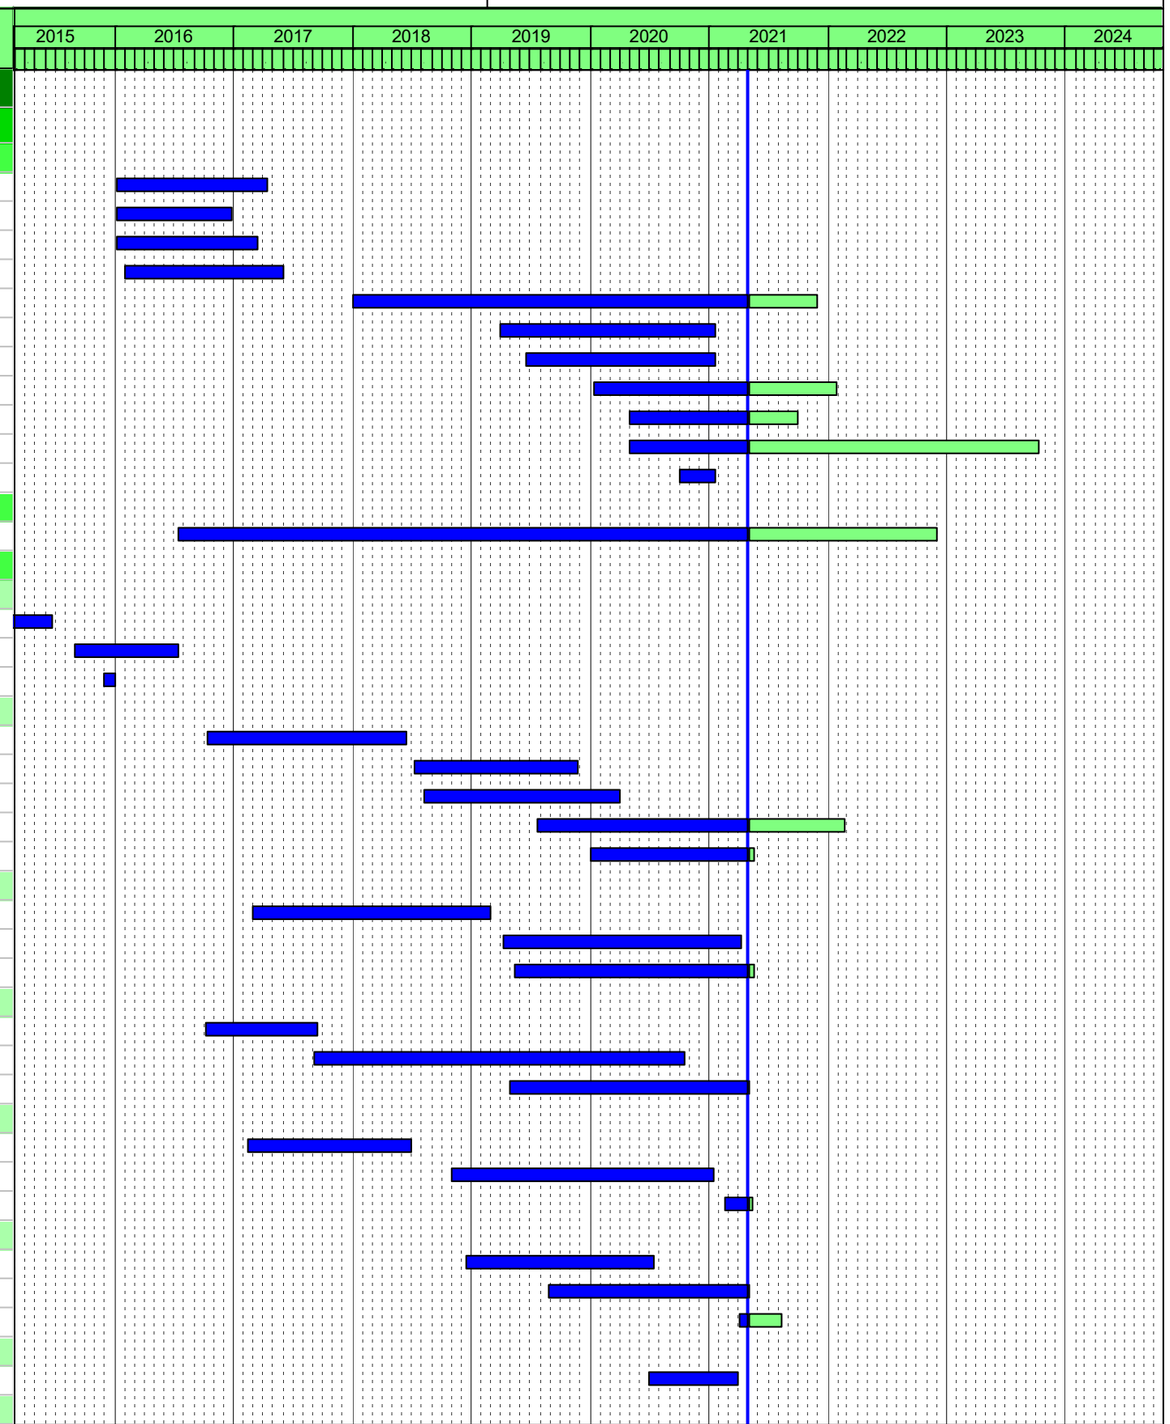

Trabajo Actual
Remaining Work
Critical Remaining Work
Hito

SE ALTO TAMEGA
PROGRAMA RESUMO

Planeamento com comissionamento dos grupos de Gouvães e Daivões com Tensão na Linha Norte Ribeira de Pena - Vieira do Minho em 1-12-2021

TAM LBrev1 ACT ABR21-2-2-1

ACT ABR 2021

Activity ID	Activity name (Portugues)	Start	Finish
RES1320	EES Grupo 4	01-Mar-21 A	03-Jan-22
RES1310	EES Sistemas Comuns	08-Mar-21 A	01-Jul-21
RES1330	EES Grupo 3	02-Jul-21	28-Jan-22
RES1315	Disponibilidade de água para EES Dinâmicas	11-Aug-21	11-Aug-21
RES1340	EES Grupo 2	25-Oct-21	07-Apr-22
RES1360	Disponibilidade de energia	01-Dec-21*	01-Dec-21
RES1350	EES Grupo 1	24-Feb-22	31-May-22
RES1355	Entrada em Serviçio Gouvães		30-Jun-22
TÂMEGA		26-Feb-16 A	28-Jun-24
ACESSOS		26-Feb-16 A	06-Mar-19 A
RES1720	Acessos Margem Esquerda	26-Feb-16 A	06-Mar-19 A
RES1730	Acessos Margem Direita	15-May-17 A	08-Mar-18 A
DESVIO DE RIO		15-Dec-16 A	17-Nov-18 A
RES1700	Túnel de Desvio	15-Dec-16 A	05-Oct-18 A
RES1710	Ensecadeira auxiliar	01-Aug-17 A	17-Nov-18 A
BARRAGEM		03-Jan-18 A	15-Jan-24
RES1660	Escavação Barragem	03-Jan-18 A	27-Mar-20 A
RES1680	Descarregadores	05-Jan-18 A	14-Oct-22
RES1670	Betonagem Barragem	23-Oct-20 A	03-Oct-22
RES1690	Enchimento Albufeira	16-Oct-23	15-Jan-24
CENTRAL		13-Sep-18 A	24-Oct-23
RES1630	Escavação	13-Sep-18 A	28-May-20 A
RES1640	Betonagem	27-Aug-20 A	30-May-22
RES1820	Montagem partes embebidas de Grupo	18-Nov-20 A	22-Nov-21
RES1650	Arquitetura e acabamentos Central	30-May-22	16-Jan-23
RES1840	Montagem Grupos	02-Sep-22	24-Oct-23
CIRCUITO HIDRÁULICO		03-Dec-20 A	17-Mar-23
RES1620	Forçadas	03-Dec-20 A	27-Apr-21 A
RES1600	Tomada e Poço de ensecadeiras	07-Dec-20 A	17-Mar-23
DESMATAÇÃO		03-Feb-22	30-Jun-23
RES1610	Desmatação TÂMEGA	03-Feb-22	30-Jun-23
ENTRADA EM SERVIÇO		31-May-23	28-Jun-24
RES1560	EES Sistemas Comúns	31-May-23	08-Aug-23
RES1580	EES Grupo 2	16-Aug-23	28-Mar-24
RES1570	EES Grupo 1	13-Feb-24	28-Jun-24
RES1575	Entrada em Serviçio Tâmega		28-Jun-24
DAIVÕES		01-Sep-15 A	07-Apr-22
ACESSOS		01-Sep-15 A	05-Jun-18 A
RES1380	Acessos Margem Esquerda	01-Sep-15 A	08-Mar-17 A
RES1390	Acessos Margem Direita	27-May-16 A	05-Jun-18 A
DESVIO DE RIO		13-Jun-16 A	22-Dec-17 A
RES1400	Túnel de Desvio	13-Jun-16 A	24-Oct-17 A
RES1410	Ensecadeira auxiliar	03-Apr-17 A	22-Dec-17 A
BARRAGEM		09-Mar-17 A	12-May-21
RES1420	Escavação Barragem	09-Mar-17 A	26-Mar-18 A
RES1440	Descarregador (Bacia de dissipação)	15-Jan-18 A	17-Jul-20 A

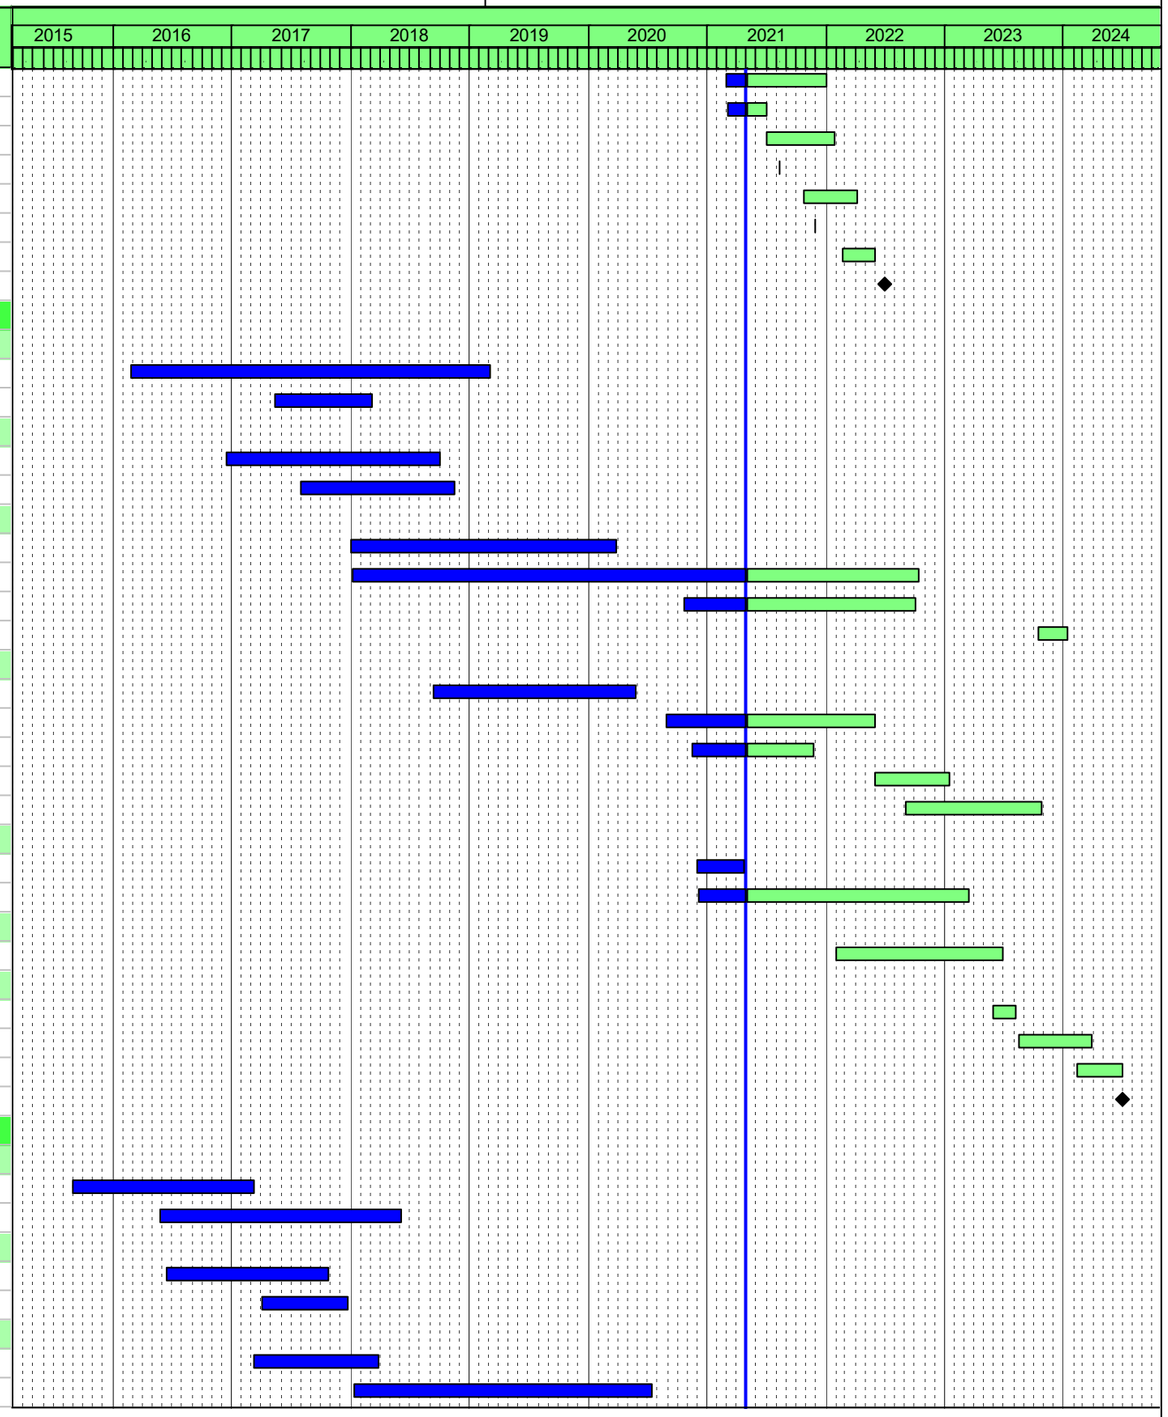

Trabajo Actual
Remaining Work
Critical Remaining Work
Hito

SE ALTO TAMEGA
PROGRAMA RESUMO

Planeamento com comissionamento dos grupos de Gouvães e Daivões com Tensão na Linha Norte Ribeira de Pena - Vieira do Minho em 1-12-2021

TAM LBrev1 ACT ABR21-2-2-1

ACT ABR 2021

Activity ID	Activity name (Portugues)	Start	Finish
RES1430	Betonagem Barragem	27-Mar-18 A	20-Aug-20 A
RES1450	Enchimento Albufeira	19-Feb-21 A	12-May-21
AÇUDE E REGULARIZAÇÃO DO RIO		25-Mar-19 A	29-Jul-21
RES1760	Escavação	25-Mar-19 A	01-Jun-21
RES1770	Açude	10-Oct-19 A	29-Jul-21
CENTRAL		07-Mar-17 A	28-Feb-22
RES1460	Escavação	07-Mar-17 A	18-May-18 A
RES1470	Betonagem	18-May-18 A	21-Sep-20 A
RES1800	Montagem partes embebidas de Grupo	07-Aug-18 A	31-Jan-20 A
RES1480	Arquitetura e acabamentos Central	24-Sep-20 A	23-Aug-21
RES1810	Montagem Grupos	08-Mar-21 A	28-Feb-22
CIRCUITO HIDRÁULICO		26-Jun-17 A	16-Nov-20 A
RES1490	Tomada e Poço de ensecadeiras	26-Jun-17 A	16-Nov-20 A
RES1500	Forçadas	25-Sep-17 A	01-Apr-20 A
RES1750	Condução Forçada Caudal ecológico	17-Sep-18 A	03-Aug-20 A
DESMATAÇÃO		01-Jul-19 A	31-Mar-21 A
RES1510	Desmatação DAIVÕES	01-Jul-19 A	31-Mar-21 A
ENTRADA EM SERVIÇO		13-Sep-21	07-Apr-22
RES1530	EES Sistemas Comuns	13-Sep-21	26-Nov-21
RES1540	EES Grupo 2	15-Oct-21	22-Dec-21
RES1590	Disponibilidade de energia	01-Dec-21*	01-Dec-21
RES1740	EES Grupo Caudal Ecológico	07-Dec-21	30-Dec-21
RES1550	EES Grupo 1	21-Dec-21	07-Mar-22
RES1850	Entrada em Serviçio Daivões		07-Apr-22

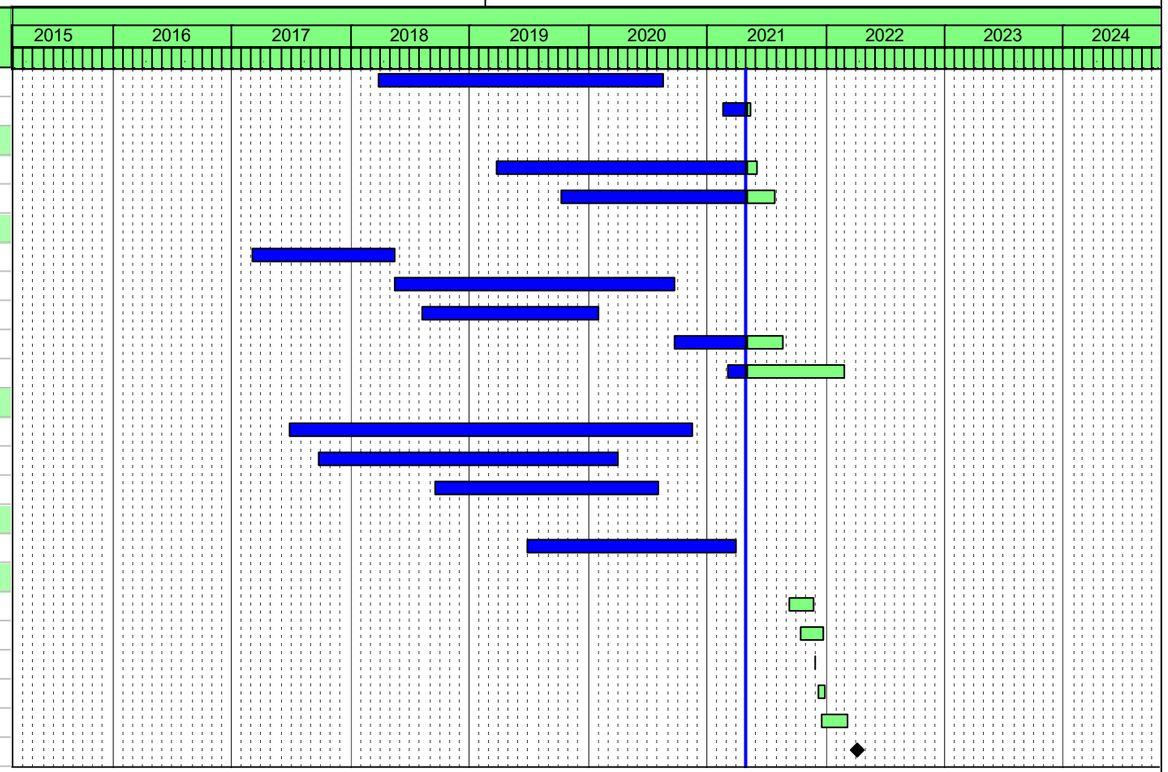

Trabajo Actual
Remaining Work
Critical Remaining Work
Hito

SE ALTO TAMEGA
PROGRAMA RESUMO

Planeamento com comissionamento dos grupos de Gouvães e Daivões com Tensão na Linha Norte Ribeira de Pena - Vieira do Minho em 1-12-2021
